INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO
Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

SISTEMA MULTIEMPRESA DE GESTIÓN VETERINARIA

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO

LUIS ALMACHI · EMILIO LÓPEZ · CRISTOPHER SANTANDER
SEBASTIÁN GONZAGA · ÁNGEL GALARZA

TUTOR: M.Sc. ELVIS PACHACAMA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

CONTROL DE VERSIÓN: 05 NOVIEMBRE 2026

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Control de avances, hitos y entrega técnica · actualización noviembre de 2026

Proyecto: ControlPets / Sistema multiempresa de gestión veterinaria | Revisión documental: 05 de noviembre de 2026

Institución: Instituto Superior Tecnológico Quito (ITQ). Documento académico de referencia para revisión y mantenimiento del proyecto.

Guía de contenidos

01 Resumen ejecutivo

02 Objetivos y entregables

03 Cronograma de fases

04 Actas originales

05 Hitos de despliegue

06 Responsabilidades y coordinación

07 Riesgos, pendientes y cierre

Los números de sección facilitan la consulta. La paginación puede variar al editar esta versión Word.

1. Resumen ejecutivo

El equipo ControlPets desarrolló una plataforma multiempresa de gestión veterinaria con frontend React, backend Java y PostgreSQL. La actualización documenta el paso de un prototipo local a una publicación en internet, con base centralizada para la revisión académica.

Entregable	Estado al 05-11-2026
Repositorio y rama de desarrollo	GitHub, rama Desarrollo.
Aplicativo web	Publicado: https://controlpets.vercel.app
API Java	Publicado: https://controlpets-api.onrender.com/VETERINARIAITQ/
Base PostgreSQL	Restaurada en Render, 24 tablas.
Acceso público	Verificado ingreso desde dispositivo móvil con rol global.
Documentación	Seis documentos institucionales revisados en esta entrega.

2. Objetivos y entregables

Objetivo	Producto / evidencia
Persistencia relacional	PostgreSQL 18, respaldo validado y restauración en nube.
Servicios REST y seguridad	API Java Tomcat con JWT y filtros de rol.
Interfaz web integrada	SPA React/Vite publicada en Vercel.
Operación multiclínica	Panel de SuperUsuario y módulos para empresas.
Aseguramiento de calidad	Informe de 17 casos originales y plan de regresión

	actualizado.
Documentación institucional	Manuales técnicos, manuales de usuario, informe de gestión y testing.

3. Cronograma y fases de ejecución

El cronograma de 16 semanas procede del informe histórico del equipo; se conserva su estructura. Se agrega el hito de despliegue público efectivamente realizado el 5 de noviembre de 2026.

Fase	Período reportado	Resultado / avance
1. Análisis y diseño	Semanas 1–3	Modelo relacional, arquitectura y requisitos.
2. Desarrollo backend	Semanas 4–8	Java, filtros, API, servicios/DAO y empaquetado WAR.
3. Desarrollo frontend	Semanas 9–12	React/TypeScript y módulos de gestión veterinaria.
4. Testing y QA	Semanas 13–14	17 casos históricos, 4 defectos registrados.
5. Cierre documental	Semanas 15–16	Manuales y documentación de integración.
Hito adicional: publicación	05-11-2026	PostgreSQL/Render, backend Docker, Vercel, ingreso móvil.

4. Actas y minutas originales

Minuta N.° 01 — 03 de julio de 2026

Reunión virtual de planificación con todos los integrantes. Tema: diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER), distribución del trabajo y organización del sistema. Acuerdo documentado: concluir revisión del DER y sorteo de roles y módulos.

Minuta N.° 02 — 09 de julio de 2026

Reunión virtual de asignación de módulos y roles del equipo. Acuerdos documentados: cada integrante desarrollará su componente y reportará avances en el grupo oficial de WhatsApp.

Se conservan las minutas descritas en el informe original. No se crean actas ni asistentes adicionales sin respaldo documental.

5. Hitos del despliegue público

Hito	Evidencia
Respaldo de producción	pg_dump -Fc de aplicacion_veterinaria; 24 tablas.
Restauración cloud	pg_restore exitoso en controlpets-db (Render PostgreSQL 18).
Backend	Dockerfile Tomcat ajustado; servicio Live en Render.
Frontend	Vercel CLI: deploy Production Ready; alias controlpets.vercel.app.

Conectividad	Configuración CORS_ORIGIN/FRONTEND_URL al dominio público.
Demostración móvil	Ingreso de superusuario y visualización de panel desde teléfono.

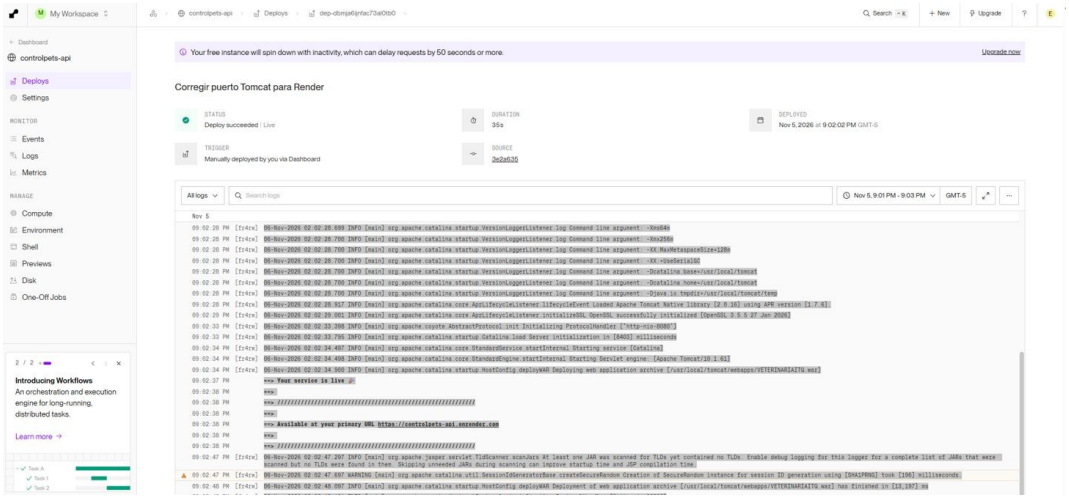


Figura 1. Evidencia del despliegue del backend.

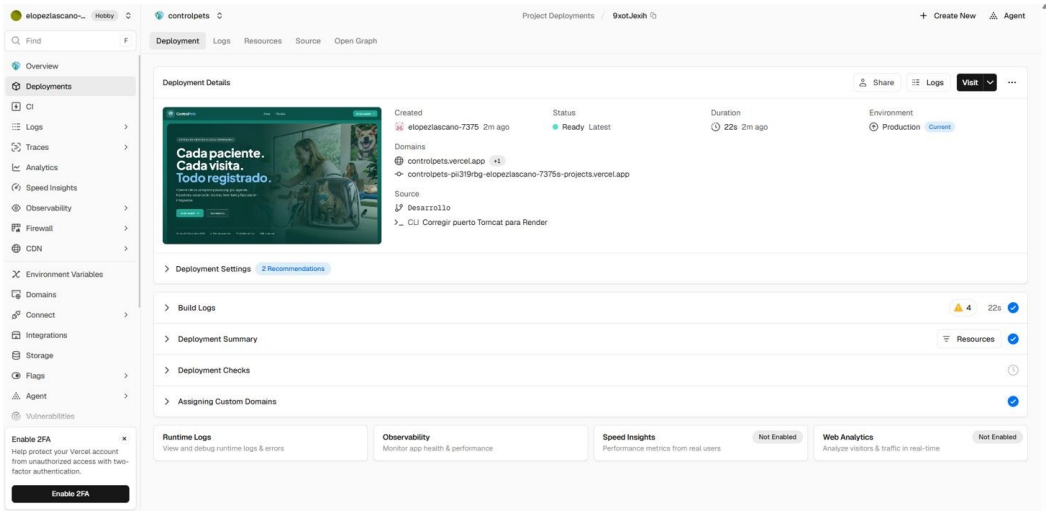


Figura 2. Evidencia del frontend publicado.

6. Responsabilidades y coordinación de cambios

El código permanece en el repositorio del equipo. Para evitar inconsistencias, se recomienda revisar ramas, migraciones y pruebas antes de publicar. Los cambios de Java requieren deploy del servicio Render, los cambios React requieren despliegue Vercel, y las nuevas tablas o columnas requieren SQL aplicado en PostgreSQL de Render.

1. Integrar código aprobado en rama Desarrollo; registrar cambios y responsable en commit o acta.
2. Preparar y revisar migraciones SQL de nuevas funcionalidades.
3. Crear respaldo de base cloud y aplicar migraciones con verificación.
4. Desplegar backend y frontend; registrar evidencia de funcionamiento.
5. Actualizar manuales y reporte de QA con la funcionalidad entregada.

7. Riesgos y pendientes de cierre

Riesgo / pendiente	Responsable sugerido / acción
Vencimiento de PostgreSQL Free	Administrador del despliegue: respaldo previo al cierre de periodo gratuito.
Render Free se suspende por inactividad	Equipo expositor: abrir sistema antes de presentación.
Cambio de esquema sin migración	Desarrolladores: entregar SQL versionado y probar en copia.
Función ficha/carné de vacunación	Equipo funcional: implementar reportes y documentar evidencias.
Módulo mensualidades	Equipo de desarrollo: validar tablas, permisos y flujo end-to-end.
Correo SMTP en plan gratuito	Equipo técnico: validar disponibilidad; no prometer notificaciones sin prueba.

8. Criterio de cierre académico

Se considera cumplido el objetivo de publicación para la demostración al contar con página accesible, API Live, base en nube y acceso autenticado verificado. Para un cierre de producto, faltan pruebas de regresión de todos los módulos, finalización de pendientes, copias de seguridad automatizadas y revisión de seguridad operativa.

Documentación controlada: esta revisión reemplaza los seis PDF de Test_documentacion. El estado reflejado corresponde a evidencias disponibles del 5 de noviembre de 2026, no a una certificación de producción comercial.

9. Matriz de cumplimiento actualizada

Objetivo / entregable	Resultado evidenciado	Observación
Interfaz web pública	Publicada en Vercel	URL comprobada desde móvil.
Backend Java	Live en Render	Docker + Tomcat; logs conservables.
Persistencia centralizada	24 tablas en PostgreSQL Render	Backup válido; no repetir restore.
Acceso al sistema	Login global validado	Falta test de otros perfiles.
Documentación institucional	Seis reemplazos preparados	Pendiente aprobación/subida al repo.
Carné de vacunación	Pendiente	No presentar como funcionalidad cerrada.
Mensualidades	Validación pendiente	Comprobar esquema y flujo final del equipo.

10. Acta de cierre provisional del despliegue

Fecha de referencia: 05 de noviembre de 2026. Actividad: instalación local satisfactoria, preparación del respaldo PostgreSQL, creación de base en Render, publicación del WAR Docker en Render, publicación de la SPA en Vercel y verificación de acceso remoto de SuperUsuario. Responsable técnico de publicación: integrante encargado del despliegue. No se documenta aprobación formal del tutor porque no existe evidencia aportada.

11. Entrega, repositorio y ruta de documentación

ControlPets/

```
Test_documentacion/
  Manual_Usuario_final.pdf
  Manuales_Tecnico_final.pdf
  Manual de Usuario Vet.pdf
  Manual Tecnico Vet.pdf
  INFORME DE TESTING DEL SISTEMA VETERINARIO.pdf
  Informe de Gestion Vet.pdf
```

La entrega académica puede incluir los PDF de lectura y los Word editables en carpeta separada. Los cambios en estos archivos no modifican automáticamente Render, PostgreSQL ni Vercel. Conservar una versión de referencia por fecha y commit.

12. Anexo: cronograma y evidencias originales

Se incorporan las figuras de planificación del informe de gestión anterior. Son antecedentes del proyecto, no un cronograma nuevo aprobado.


Anexo G-03. Planificación original

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO
Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Cronograma de Actividades

Figura1: Diagrama de Gantt.

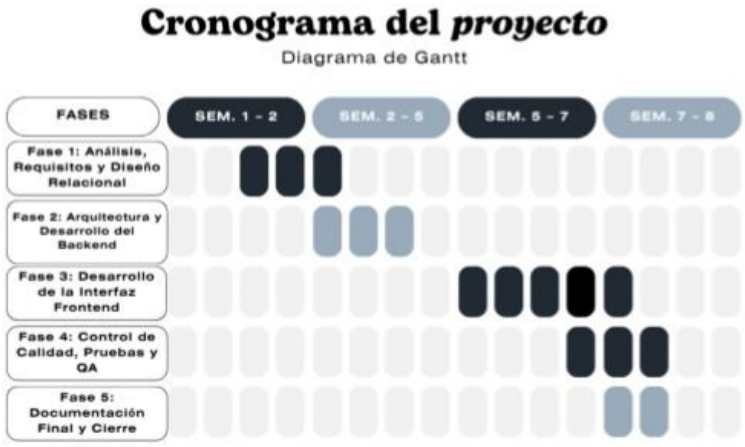

Detalle de la distribución temporal de las fases del proyecto a lo largo del período de ejecución:

Fase / Sprint	Actividades Principales	Duración Estimada	Entregable Asociado
Fase 1: Análisis y Diseño	Levantamiento de requisitos, diseño del modelo relacional en PostgreSQL (22 tablas) y definición de arquitectura en capas.	Semanas 1 - 3	Script DDL y Diagrama MER.
Fase 2: Desarrollo Backend	Implementación de Servlets Jakarta, DAOs JDBC, lógica en Services, autenticación JWT y hashing BCrypt.	Semanas 4 - 8	API REST compilada en WAR y desplegada en Tomcat.

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC


Extracto: Informe de Gestion Vet.pdf original, página 3.

Anexo G-04. Planificación original

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO
Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

Fase 3: Desarrollo Frontend	Creación de interfaces en React/TypeScript/Tailwind: Login, Empresas, Clientes, Mascotas, Citas, Facturación e Inventario.	Semanas 9 - 12	Aplicación Web integrada con la API REST.
Fase 4: Testing y QA	Pruebas funcionales de endpoints en Postman, detección y corrección de defectos (DEF-01 a DEF-04) y validaciones.	Semanas 13 - 14	Informe de Testing y Matriz de Defectos.
Fase 5: Cierre y Documentación	Redacción del Manual Técnico, Manual de Usuario y consolidación del informe final de prácticas.	Semanas 15 - 16	Manuales técnicos y operativos completos.

Figura2: Tareas listadas

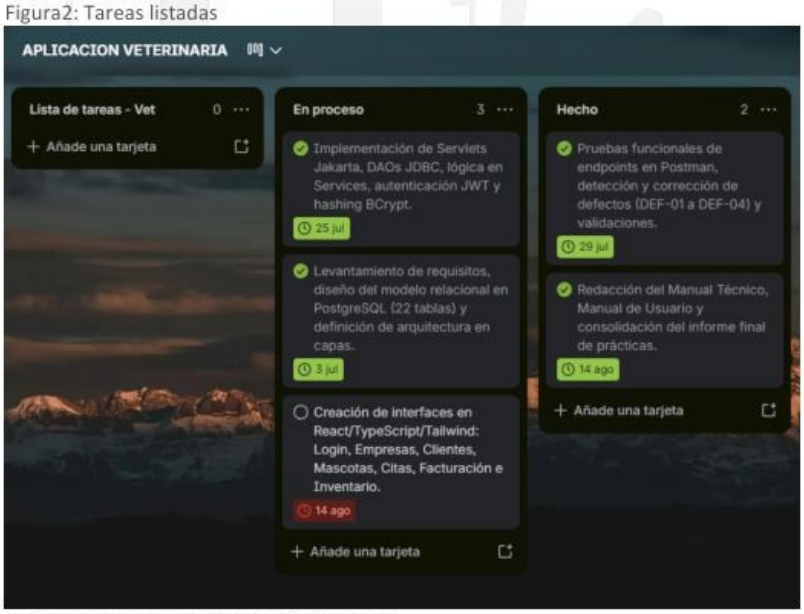

2. Actas y Registro de Minutas de Reuniones

Minuta N.° 01:

Elaboración del Diagrama Entidad-Relación y Planificación de Roles

- **Datos Generales:**

(+593) 96 356 1961 admisiones@itq.edu.ec Antonio de Ulloa N28-30 y Diego de Atienza (Esq). WWW.ITQ.EDU.EC

Extracto: Informe de Gestion Vet.pdf original, página 4.
